

FICHE D'INFORMATION DE TRAVAUX

PRDP- RD 767 – Liaison Porh-Leagal/Siviac Réalisation d'une section à 2 x 2 voies


Communes de Moréac et Evellys
août 2023

Objet de L'opération

Inscrite dans le Plan Routier Départemental Prioritaire, cette section s'intègre dans le cadre de l'aménagement de l'axe Triskell entre Vannes et Saint-Brieuc sur la RD767 et plus particulièrement sur la section Locminé - Siviac.

Les travaux consistent en la réalisation de 4500 ml de 2x2 voies entre les lieux-dits Porh Legal et Siviac sur les communes de MOREAC et EVELLYS et plus particulièrement les derniers travaux de finitions pour un raccordement complet à 2x2 voies avec la section vers Pontivy

Plan de situation

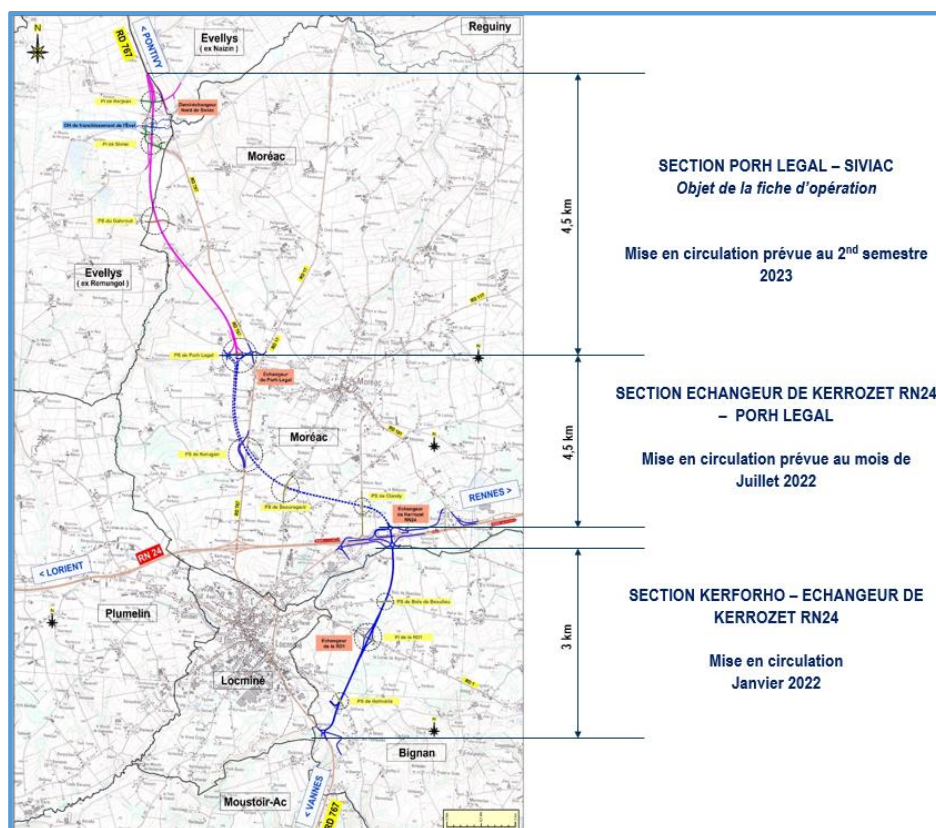

Description des travaux

Le marché nécessaire à la construction de cette section a été attribué au groupement d'entreprises

EUROVIA BRETAGNE / LESSARD TP pour un montant d'environ **10,0 M€ TTC**.

Ces entreprises auront en charge la réalisation des terrassements, de l'assainissement et des chaussées

La durée prévisionnelle des travaux est de **24 mois** à compter du 9 Mai 2022.

Pour la réalisation des travaux et pour se conformer aux différents arrêtés, nous serons accompagnés pour la prise en compte des contraintes environnementales par les bureaux d'études RIVES et AEPE GINKO.

Pour ce qui concerne la prise en compte de la coordination et de la sécurité sur le chantier nous serons accompagnés par l'agence PROJECTIO.

Information travaux - Planning

Les travaux de finitions de la section à 2 x 2 voies comprise entre Porh-Legal et Siviac vont redémarrer à compter du 04 septembre 2023 pour se terminer fin octobre 2023
Ils se résument comme suit :

- travaux de finition de la couche de roulement au niveau du raccordement avec la 2 x 2 voies existante → reprofilage BBSG + BBTM
- Coulage du mur béton en axe de la RD767 – raccordement avec 2 x 2 voies existante
- Grave bitume + BBSG sur la bretelle de sortie Pontivy vers Kerjean
- BBSG sur les voies communales Est RD767
- Construction de l'ouvrage de décharge
- Finition signalisation + glissières
- Aménagement zones humides

Planning d'intervention


	Septembre					Octobre			
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Travaux raccordement Nord 2 x 2 voies									
Terrassement et empiérement bretelle Kerjean Ouest									
Ouvrage décharge sur RD 767									
GB bretelle Kerjean									
OUEST Repro BBSG, BBSG									
BBTM Ouest au 488+700									
DBA									
SH + Glissières									
Finitions									
ZONE HUMIDE									
Aménagement									
Semies									
Plantation									

Les travaux de finition de la couche de roulement au niveau du raccordement Nord avec la 2 x 2 voie existante se feront sous basculement de la circulation au niveau de la section à raccorder (3jrs)

Le mur béton en axe pourra être coulé à l'issue de cette intervention. La 2 x 2 voies sera alors intégralement ouverte entre Kerforho (Commune de Bignan) et L'échangeur de Kerroux (Commune de Moustoir Remungol). Ouverture complète programmée mi-octobre 2023.

Les travaux sur les zones humides se feront sans effet sur la circulation.

Plan de situation

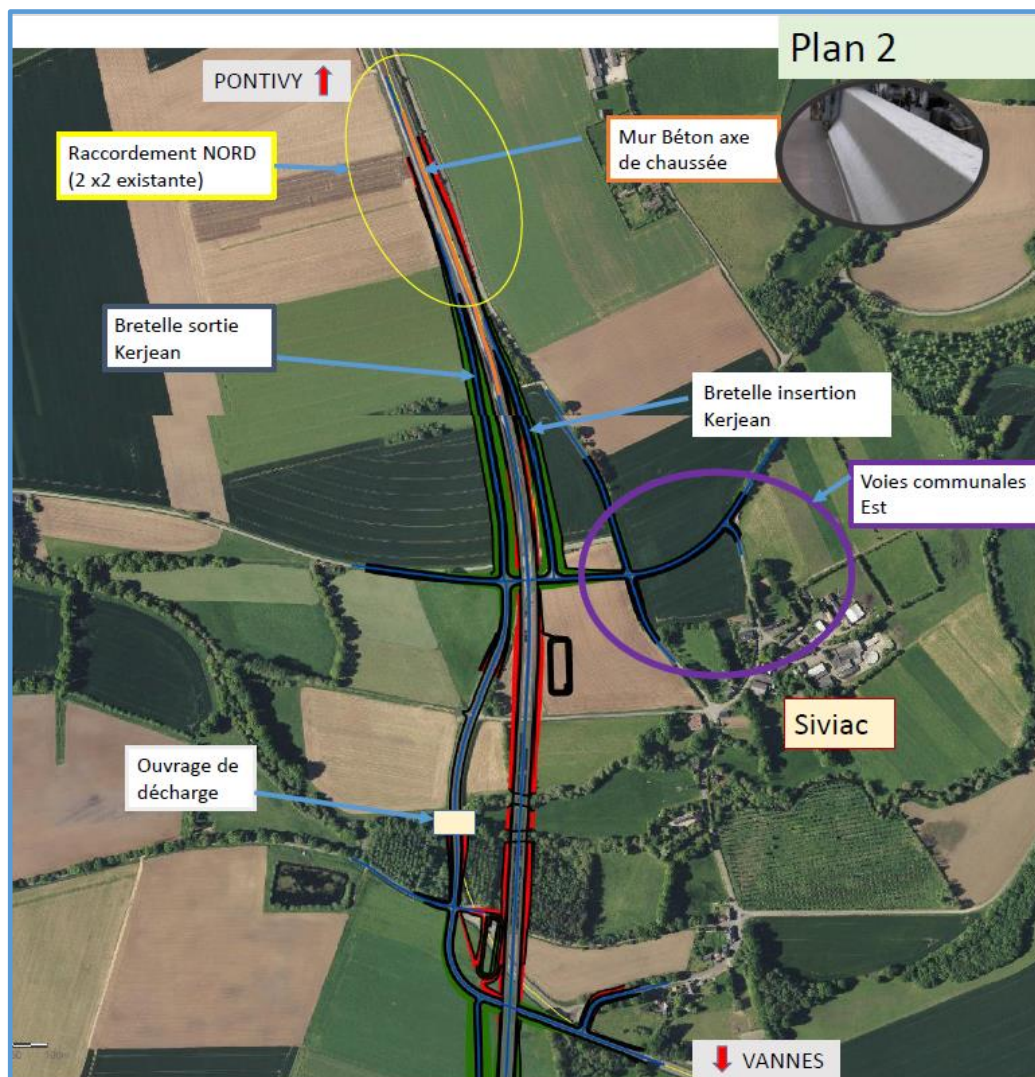

**Le conseil départemental attire l'attention de l'ensemble des usagers :
Restez vigilant et respectez les agents qui interviennent sur les chantiers
dans le but d'améliorer les conditions de circulation.**

Contacts

Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental du Morbihan

Maîtrise d'œuvre : Direction des routes et de l'aménagement

Contact avec les élus ou la presse :

Davy DANO (cabinet) 02 97 54 80 02

Xavier DOMANIECKI (directeur DRA) : 02 97 54 83 60 – email : xavier.domaniecki@morbihan.fr

Contacts pour tous les usagers, riverains ou associations :

Message par courrier à M. le Président du conseil départemental

Ou voie électronique dans la rubrique:

<https://www.morbihan.fr/contactez-nous/> ou par mail :

[**routes@morbihan.fr**](mailto:routes@morbihan.fr)

Merci d'éviter d'adresser un mail sur une boîte personnelle, car il n'y aura pas de réponse compte-tenu du nombre important de messages.
